

事例写真集

工場出荷から上棟まで

株式会社 ナカムラ

〒669-2465 兵庫県篠山市栗栖野27-1 TEL 079-595-1515/FAX 079-595-1516 URL http://nakamura-forest.co.jp/






プレカットライン



通柱、管柱、金物を全て付けて出荷



金物を全て付けて出荷するので、大工の手間や現場での場所が不要

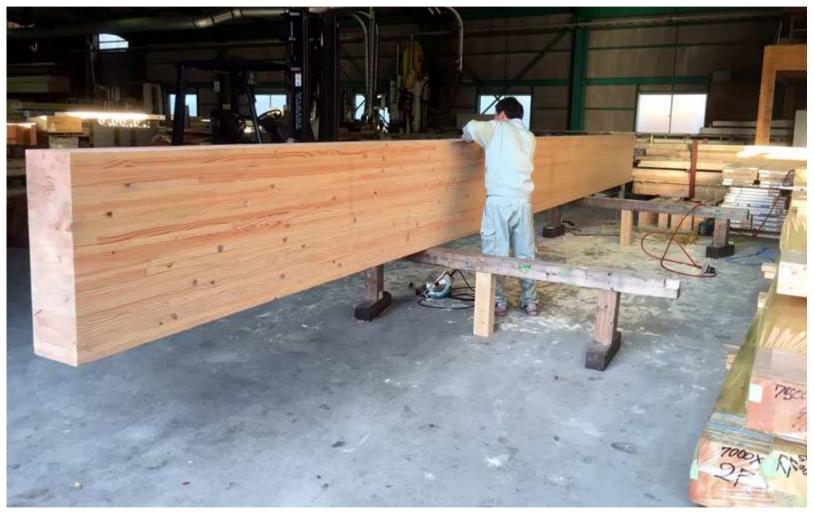

大断面集成材



パネル製作 ラフ開口の開いたパネルで断熱材を入れて納入することも可能



出荷



搬入 現場状況により10t・4t・2t車にも対応



基礎アンカ M12とM16を使用



土台据え付け 基礎パッキン使用



土台据え付け



上棟日前日までに1階床まで張り終えます。24ミリ又は28ミリ使用(床合板プレカットはオプション)




上棟当日 朝 通柱から



梁の落とし込みとピンの打ち込み



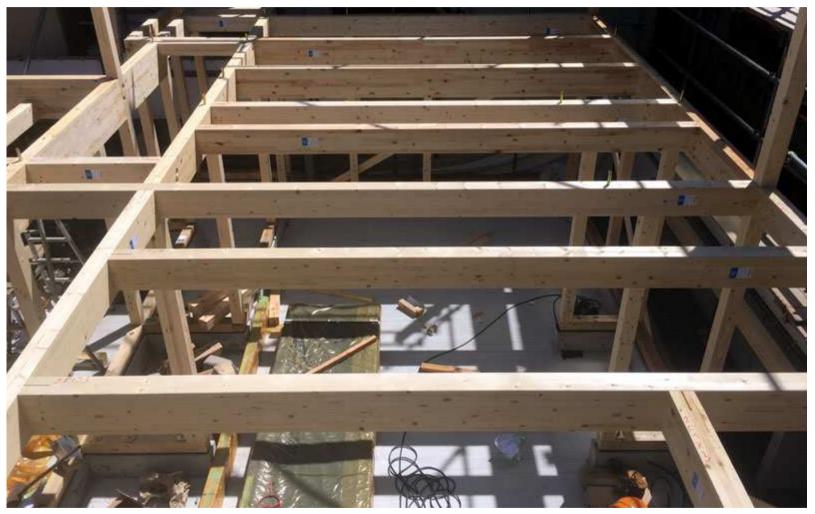

梁の落とし込み



ピンの打ち込み、立ち起し




2F床貼りと1Fパネルはめ込み同時進行



1Fパネルはめ込み



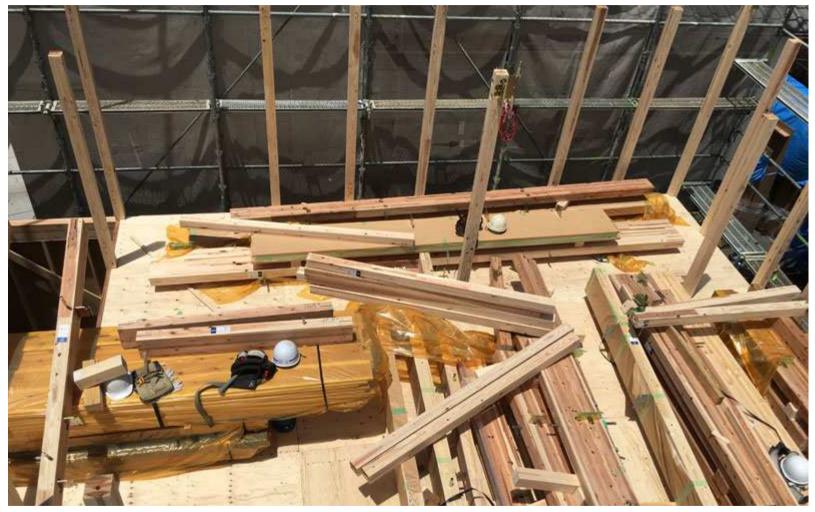

2F管柱立て



RF梁落とし込み



RF梁落とし込み



RF梁落とし込み



2Fパネルはめ込み バルコニーパネルや妻パネルも有り



2Fパネルはめ込み





隅木・谷木もプレカットします



隅木・谷木もプレカットします



垂木は通常頭部分のみ勾配カットし鼻先は現場カット



オプションでオールジャストカットもします



野地合板プレカットもオプションで行っています



野地合板プレカットもオプションで行っています



小屋束まで全て集成材を使用しています



上棟日終了 ルーフィング貼り、サッシ枠搬入

上棟2週間前 上棟前日 上棟日(大工5人、レッカー) 資材搬入 ①通し柱·胴差し·梁·2F床 図面承認後 設置 柱脚金物 コンピュータ入力 ②1Fバネル・2F管柱・桁、梁 土台·大引 躯体加工(全自動ライン) ③小屋・2F壁バネル 床下断熱材 バネル製作 1F床合板·1F管柱 ④タルキ·野地

